Versão	Data	Autor	Notas de Revisão
1.0	12/03/2026	Domingos S. X. Martins	Versão de protótipo inicial da ideia.

1. Situação atual e justificativa do projeto

O presente projeto é resultado de uma pesquisa de mercado da oferta de serviços informais na sociedade brasileira. Ele objetiva o desenvolvimento de um software que integre a busca e a contração de serviços informais em uma plataforma digital. Com isso, busca centralizar a oferta de serviços informais (construção civil, beleza, etc.), com potenciais clientes, para promover o desenvolvimento econômico e a prestação do serviço.

2. Critérios de sucesso do projeto

Para o sucesso do projeto, estabelece-se que o sucesso corresponde a disponbilizada do sistema online, com a adesão de no mínimo 50 clientes de forma orgância, e 10 contratações de serviços através da plataforma. Logo, em termos gerais, o sucesso do projeto corresponde a sua utilização "in loco".

- *Objetivo Geral: desenvolvimento, implementação, operação e documentação de um sistema que ficará no ar, incluindo o seu uso por usuários.*
- *Objetivos Específicos:*
    - *Documentar o projeto e a ERS (Especificação de Requisitos de Software), de maneira a estabelecer os pressupostos, padrões e limites para a equipe de desenvolvimento, operação e manutenção.*
    - *Obter investidores anjo para o desenvolvimento do projeto.*
    - *Estruturar as equipes que farão parte do projeto e suas respectivas funções.*
    - *Desenvolver um MVP (Minimum Viable Product) e disponibilizar on-line na rede.*
    - *Engajar os primeiros usuários de forma orgânica e analisar os primeiros feedbacks para melhoria do sistema.*
    - *Implementar o projeto, deixando-o online*
    - *Aderir 50 clientes*
    - *Obter 10 contratações pelo sistema.*

3. Descrição do projeto

1. Produto do projeto

O produto do projeto corresponde a um SaaS, como um sistema de oferta e contratação de serviços terceirizados. Um profissional da construção civil poderá ofertar seu trabalho na plataforma, e alguém que necessite desse profissional, poderá contratá-lo pela plataforma de forma segura e garantida. O produto corresponde a esse sistema que permite a ligação entre a oferta de serviços e a demanda dos clientes.

2. Cronograma básico do projeto

Como é a primeira versão deste projeto, ainda faltando estipular com maior concretude os limites do projeto, as datas exatas do cronograma ainda precisam ser definidas. Entretanto, estipula-se um cronograma base num intervalo de 360 dias (1 anos), que incluem desde as etapas iniciais (Etapa Inicial) até as etapas finais (Etapa Avaliação dos Usuários).

3. Orçamento do Projeto

Diante da presente etapa ser da estruturação do projeto em si, tendo noção de onde se quer chegar, como se quer chegar e também o que se quer construir, há a necessidade do levantamento para o desenvolvimento do orçamento. Entretanto, a princípio, três pilares constituirão o orçamento: pessoal, infraestrutura, questões legais. Mediante um breve cálculo estimado para a execução do projeto, estima-se um orçamento base de R$500.000. Tal valor engloba: recursos humanos, infraestrutura, testagem, desenvolvimento, marketing, documentais legais, publicização e análise dos resultados.

4. Principais requisitos do produto/serviço

- *Disponibilização do serviço online tanto para versão desktop (navegador), como para versão móvel (mobile)*
- *Escopo determinado de serviços aceitos, regras de negócio do sistema, política de uso e documentos legais do software*
- *Agilidade, disponibilidade, escalabilidade e facilidade para o usuário final.*

5. Restrições

Referente a restrições destaca-se:

- *Orçamento limitado para o desenvolvimento*
- *Tempo de desenvolvimento estipulado*
- *Análise das Leis Trabalhistas Brasileira*
- *Análise da LGPD do Brasil*

6. Premissas

- *Disponibilizar um MVP funcional no primeiro ciclo de desenvolvimento*
- *Realizar constantemente a revisão e refatoração (quando necessária), buscando eficiência e princípios de "design patterns" e "clean code", com foco em segurança, escalabilidade e eficiência.*
- *Uso de metodologias ágeis para o desenvolvimento do sistema, buscando fluidez no desenvolvimento pela equipe, e resultados tangíveis agregados.*

APROVAÇÕES			
Função	**Nome**	**Assinatura**	**Data**
Gerente do Projeto	**Domingos Jr.**	**Domingos**	**12/03/2026**
Investidor Anjo I	**-**	**-**	**-**
Investidor Anjo II	**-**	**-**	**-**
Investidor Anjo III	**-**	**-**	**-**

Liste as partes interessadas do projeto

Parte Interessada	Etapa do Projeto	Descrição da função da Parte Interessada na etapa do Projeto
IA - Investidores Anjo	Etapa Inicial / Etapa de Avaliação do Projeto / Etapa de Auditoria Atuarial	Responsáveis pelo financiamento do orçamento base que permite o desenvolvimento de todo o projeto.
DLP - Diretores/Líderes do Projeto	Etapa Inicial / Etapa de Avaliação do Projeto / Etapa de Prototipação do Sistema / Etapa de Desenvolvimento Técnico / Etapa de Documentação / Etapa de Revisão do Sistema / Etapa de Publicização do Sistema / Etapa Produção / Etapa Avaliação dos Usuários / Etapa de Auditoria Atuarial / Etapa de Orçamento	Composto pelos líderes conjuntamente com os Investidores Anjos, responsáveis pela sinergia e execução do projeto.
TDEV - Time de Desenvolvimento	Etapa de Desenvolvimento Técnica	Responsáveis pelo desenvolvimento técnico do software, que engloba o núcleo do software e seus desmembramentos.
TDSG - Time de Design	Etapa de Prototipação do Sistema	Responsáveis pelo estudo e elaboração do design para todo o sistema, focando em boas práticas de UI/UX para o usuário final e seus feedbacks.
TQA - Time QA	Etapa de Revisão do Sistema	Responsáveis pela testagem e otimização do sistema, com enfoque em escalabilidade, eficiência e segurança do sistema.
TM - Time Marketing	Etapa de Publicização do Sistema	Reponsáveis pelo estudo de mercado de publicidade, promoção de campanhas publicitárias e geração de leads para novos usuários.
TJ - Time Jurídico	Etapa de Documentação	Responsáveis pela elaboração jurídica que corresponde a utilização do sistema pelos usuários, assim como pela elaboração dos preceitos e responsabilidades legais do sistema e equipe.
TINFRA - Time de Infraestrutura	Etapa de Desenvolvimento Técnico	Responsáveis pela organização eficiente da infraestrutura na qual será hospedado o sistema, com enfoque em segurança, escalabilidade e eficiência.
TRS - Time de Requisitos do	Etapa Inicial / Etapa de Avaliação do	Responsáveis pela documentação

Sistema	Projeto	do software, levantamentos de requisitos, documentação do sistema e análise dos dados coletados pelos usuários através de seus feedbacks.
THD - Time de HelpDesk	Etapa Produção / Etapa de Avaliação dos Usuários	Responsáveis pelo suporte técnico no primeiro lançamento do sistema, buscando coletar os principais feedbacks para o Time de Requisitos. Assim como atender todos os chamados dos usuários que solicitarem.
UPC - Usuários – Prestadores/Contratantes	Etapa de Produção	Responsáveis pelo uso do sistema, incluindo oferta de prestação de serviços, contratação de serviços.
TCONT – Time de Contabilidade	Etapa Inicial / Etapa Auditoria Atuarial / Etapa de Orçamento	Responsáveis pelo levantamento de orçamentos, organização dos recursos financeiro e do tesouro do projeto. Elaboração da auditoria final do projeto.

II - Matriz de [Poder/Interesse // Pode/Influência // Influência/Impacto]

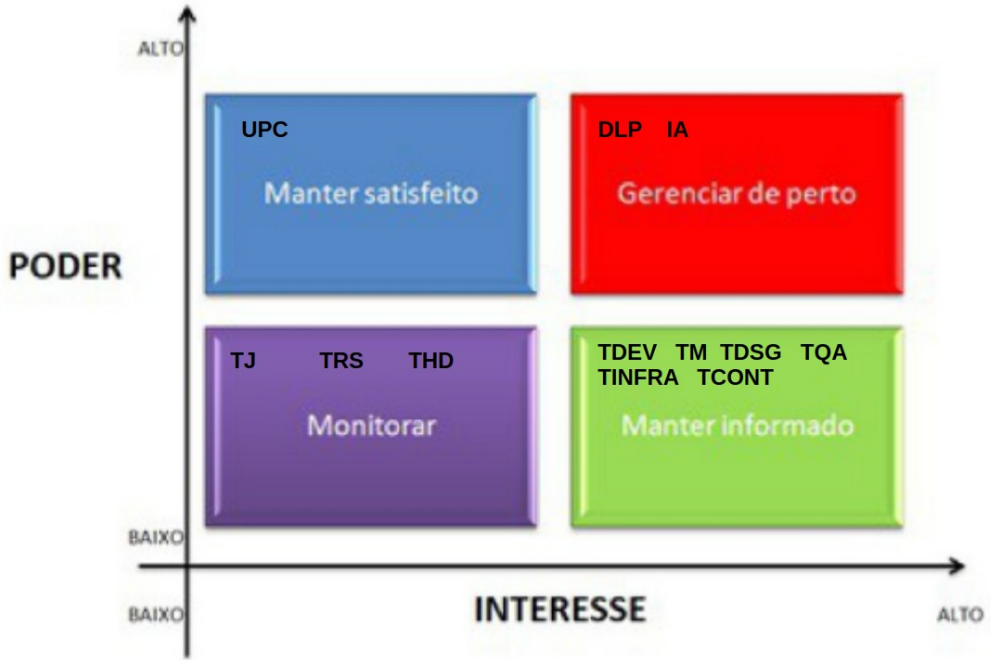

III - Liste a equipe do projeto e o papel de cada um:

Nome	Papel/Cargo	Descrição das responsabilidades
Nicolas Pedroso	**Investidor Anjo**	**Patrocínio e investimento financeiro no projeto.**
Magda Madalena	**Investidor Anjo**	**Patrocínio e investimento financeiro no projeto.**
Arlindo Souza	**Líder Time de Desenvolvimento**	**Responsável por gerenciar e coordenar a equipe de**

		desenvolvimento. Apresentar resultados e promover integração do time de desenvolvimento.
Abreu Silva	**Desenvolvedor**	**Responsável pelo desenvolvimento do software, teste e boas práticas de código.**
Abel Souza	**Desenvolvedor**	**Responsável pelo desenvolvimento do software, teste e boas práticas de código.**
Bernardo Castanha	**Líder Time de Design**	**Responsável pelo gerenciamente e coordenação da equipe de UI/UX. Responsável pela averiguação de dados de feedback e coordenação de boas práticas de design cerntradas no usuário.**
Bruna Garcia	**Design UI/UX**	**Responsável pelo desenvolvimento de interfaces para o software, assim como sistema web. Da mesma forma, levantamento de dados de testes de usuário.**
Bruno Teixeira	**Design UI/UX**	**Responsável pelo desenvolvimento de interfaces para o software, assim como sistema web. Da mesma forma, levantamento de dados de testes de usuário.**
Caio Marlon	**Líder Time de QA**	**Responsável pelo gerenciamento do time de testes, execução de testes e integração do sistema.**
Carlos Pedro	**Desenvolvedor QA**	**Responsável pela testagem do software, garantindo feedback de falhas e sucessos. Responsável pela segurança e em encontrar fragilidades.**
Diana Porto	**Líder Time de Marketing**	**Responsável pelo gerenciamento da equipe de marketing, organização de campanhas e análise de leads e captação de usuários.**
Douglas Pedroso	**Especialista em Marketing**	**Responsável por organizar campanhas de marketing e articular parcerias com outras empresas.**
Denis Silva	**Social Media**	**Responsável pela organização de campanhas em redes sociais. Coordenação e gerenciamente das redes sociais do projeto, assim como divulgação.**
Eduarda Lima	**Líder Time Jurídico**	**Responsável pela documentação legal do software, assim como registros legais do mesmo. Organizar estrutura legal do software e defender o projeto em causas legais.**
Edimar Torres	**Advogado Especialista TI**	**Responsável pela organização da**

		documentação com a líder. Responsável por revisar os documentos legais, representar a empresa na área jurídica e defender o desenvolvimento ético com base na lei.
Fabio Andradas	**Líder Time Infraestrutura**	**Responsável pela coordenação do time de infraestrtura, englobando seu gerenciamento. Responde pela responsabilidade da estrutura do servidor e sua disponibilidade e escalabilidade.**
Fernanda Melo	**Desenvolvedora de Infra**	**Responsável pela implantação e manutenção do sistema de infraestrutura do software. Operações de nuvem.**
Ferdinando Olivio	**Desenvolvedor de Infra**	**Responsável pela implantação e manutenção do sistema de infraestrutura do software. Operações de nuvem.**
Humberto Teixeira	**Líder Time de Requisitos**	**Responsável pelo gerenciamento do time de requisitos. Responsável pela documentação do software em nível técnico, engenharia de software e análise de dados de uso do software.**
Hector Bastos	**Engenheiro de Software**	**Engenheiro responsável pelo levantamento de requisitos, produção de documentação e análise de dados coletados.**
Helena Troiana	**Engenheira e Software**	**Engenheira responsável pelo levantamento de requisitos, produção de documentação e análise de dados coeltados.**
Icles Marques	**Líder Time Help Desk**	**Responsável pelo gerenciamento da equipe de help desks. Organização do time, levantamento de chamados, resolução de conflitos e organização de dados.**
Indiara Souza	**Help Desk Plena**	**Responsável pelo atendimento de chamados, organização de tíquetes e organização dos dados. Responsável pela resolução dos problemas de clientes.**
Igor Marlon	**Help Desk Junior**	**Responsável pelo atendimento de chamados, organização de tíquetes e organização dos dados. Responsável pela resolução dos problemas de clientes.**
Jordana Faria	**Líder Time de Contabilidade**	**Responsável pelo orçamento, levantamento de valores, pagamento de time, contabilidade atuarial e organização dos recursos financeiros do projeto. Gerenciamento do time contábil e tesouro do projeto.**

Julia Pereira	**Contabilista**	**Responsável pela operacionalização do orçamento do projeto, compra de materiais e prestação de contas.**
João Farias	**Contabilista**	**Responsável pelo pagamento dos recursos humanos do projeto, organização financeira e integridade de pagamentos.**
Jéssica Magda	**Contabilista**	**Responsável pela auditoria fiscal do projeto, organização dos dados fiscais perante leis públicas e documentação financeira.**

IV - Liste os possíveis conflitos (pelo menos 5) decorrentes de decisões de projeto ou da distribuição de responsabilidades. Na resolução, indique a técnica que deveria ser utilizada para a resolução.

Envolvidos	Situação de conflito	Resolução
Jordana Pereira (Líder Contábil) e Fabio Andradas (Líder de Infraestrutura)	Incompatibilidade de valores solicitados pela equipe de infraestrutura para a equipe contábil. Acima do teto.	**Colaborando** – O GP reunirá os dois líderes para mediar o conflito, buscando a melhor resolução que esteja dentro do teto orçamentário e ainda seja possível a estrutura de infraestrutura.
Bruna Gracia (Design UI/UX) e Bruno Teixeira (Design UI/UX)	Dependência entre os designers, onde o serviço de um depende do outro. Logo está ocorrendo atraso na entrega por essa relação, gerando conflito.	**Confrontando e Resolvendo o Problema** – O Líder reorganizará o fluxo de trabalho da equipe, buscando equilibrar o desenvolvimento da equipe, de forma que não atrapalhe as entregas e permita a colaboração mútua, sem dependências.
Eduarda Lima (Líder Jurídico) e Humberto Teixeira (Líder Requisitos)	A documentação de requisitos, mesmo bem organizada, fere diversas cláusulas da Lei Geral de Proteção de Dados.	**Afastando e Evitando** – O GP se reunirá com os dois líderes e mediará o conflito, apontando a importância de respeitar a LGPD e a adequação do documento de requisitos. Da mesma forma, que o Time Jurídico deve ficar no seu escopo e questionar antes de inferir.
Diana Porto (Líder de Marketing) e Denis Silva (Social Media)	O Social Media está usando “memes” para engajar nas redes sociais, mas isso está gerando comentários negativos de possíveis usuários.	**Impondo** – O Líder de Marketing, orientado pelo GP, irá impor a proibição desse tipo de linguagem, já que poderá trazer uma imagem negativa para o projeto.
Indiara Souza (HelpDesk Pleno) e Igor Marlon (HelpDesk Junior)	A plena está sobrecarregando tíquetes para o júnior, o qual reclama pela incapacidade de lidar com tanta demanda transferida pela plena.	**Estabilizando e Acomodando** – O Líder de HelpDesk se reunirá com o time, buscando encontrar um equilíbrio harmônico para as demandas de cada um, sem ocorrer a sobrecarga e respeitando o escopo de cada um.
